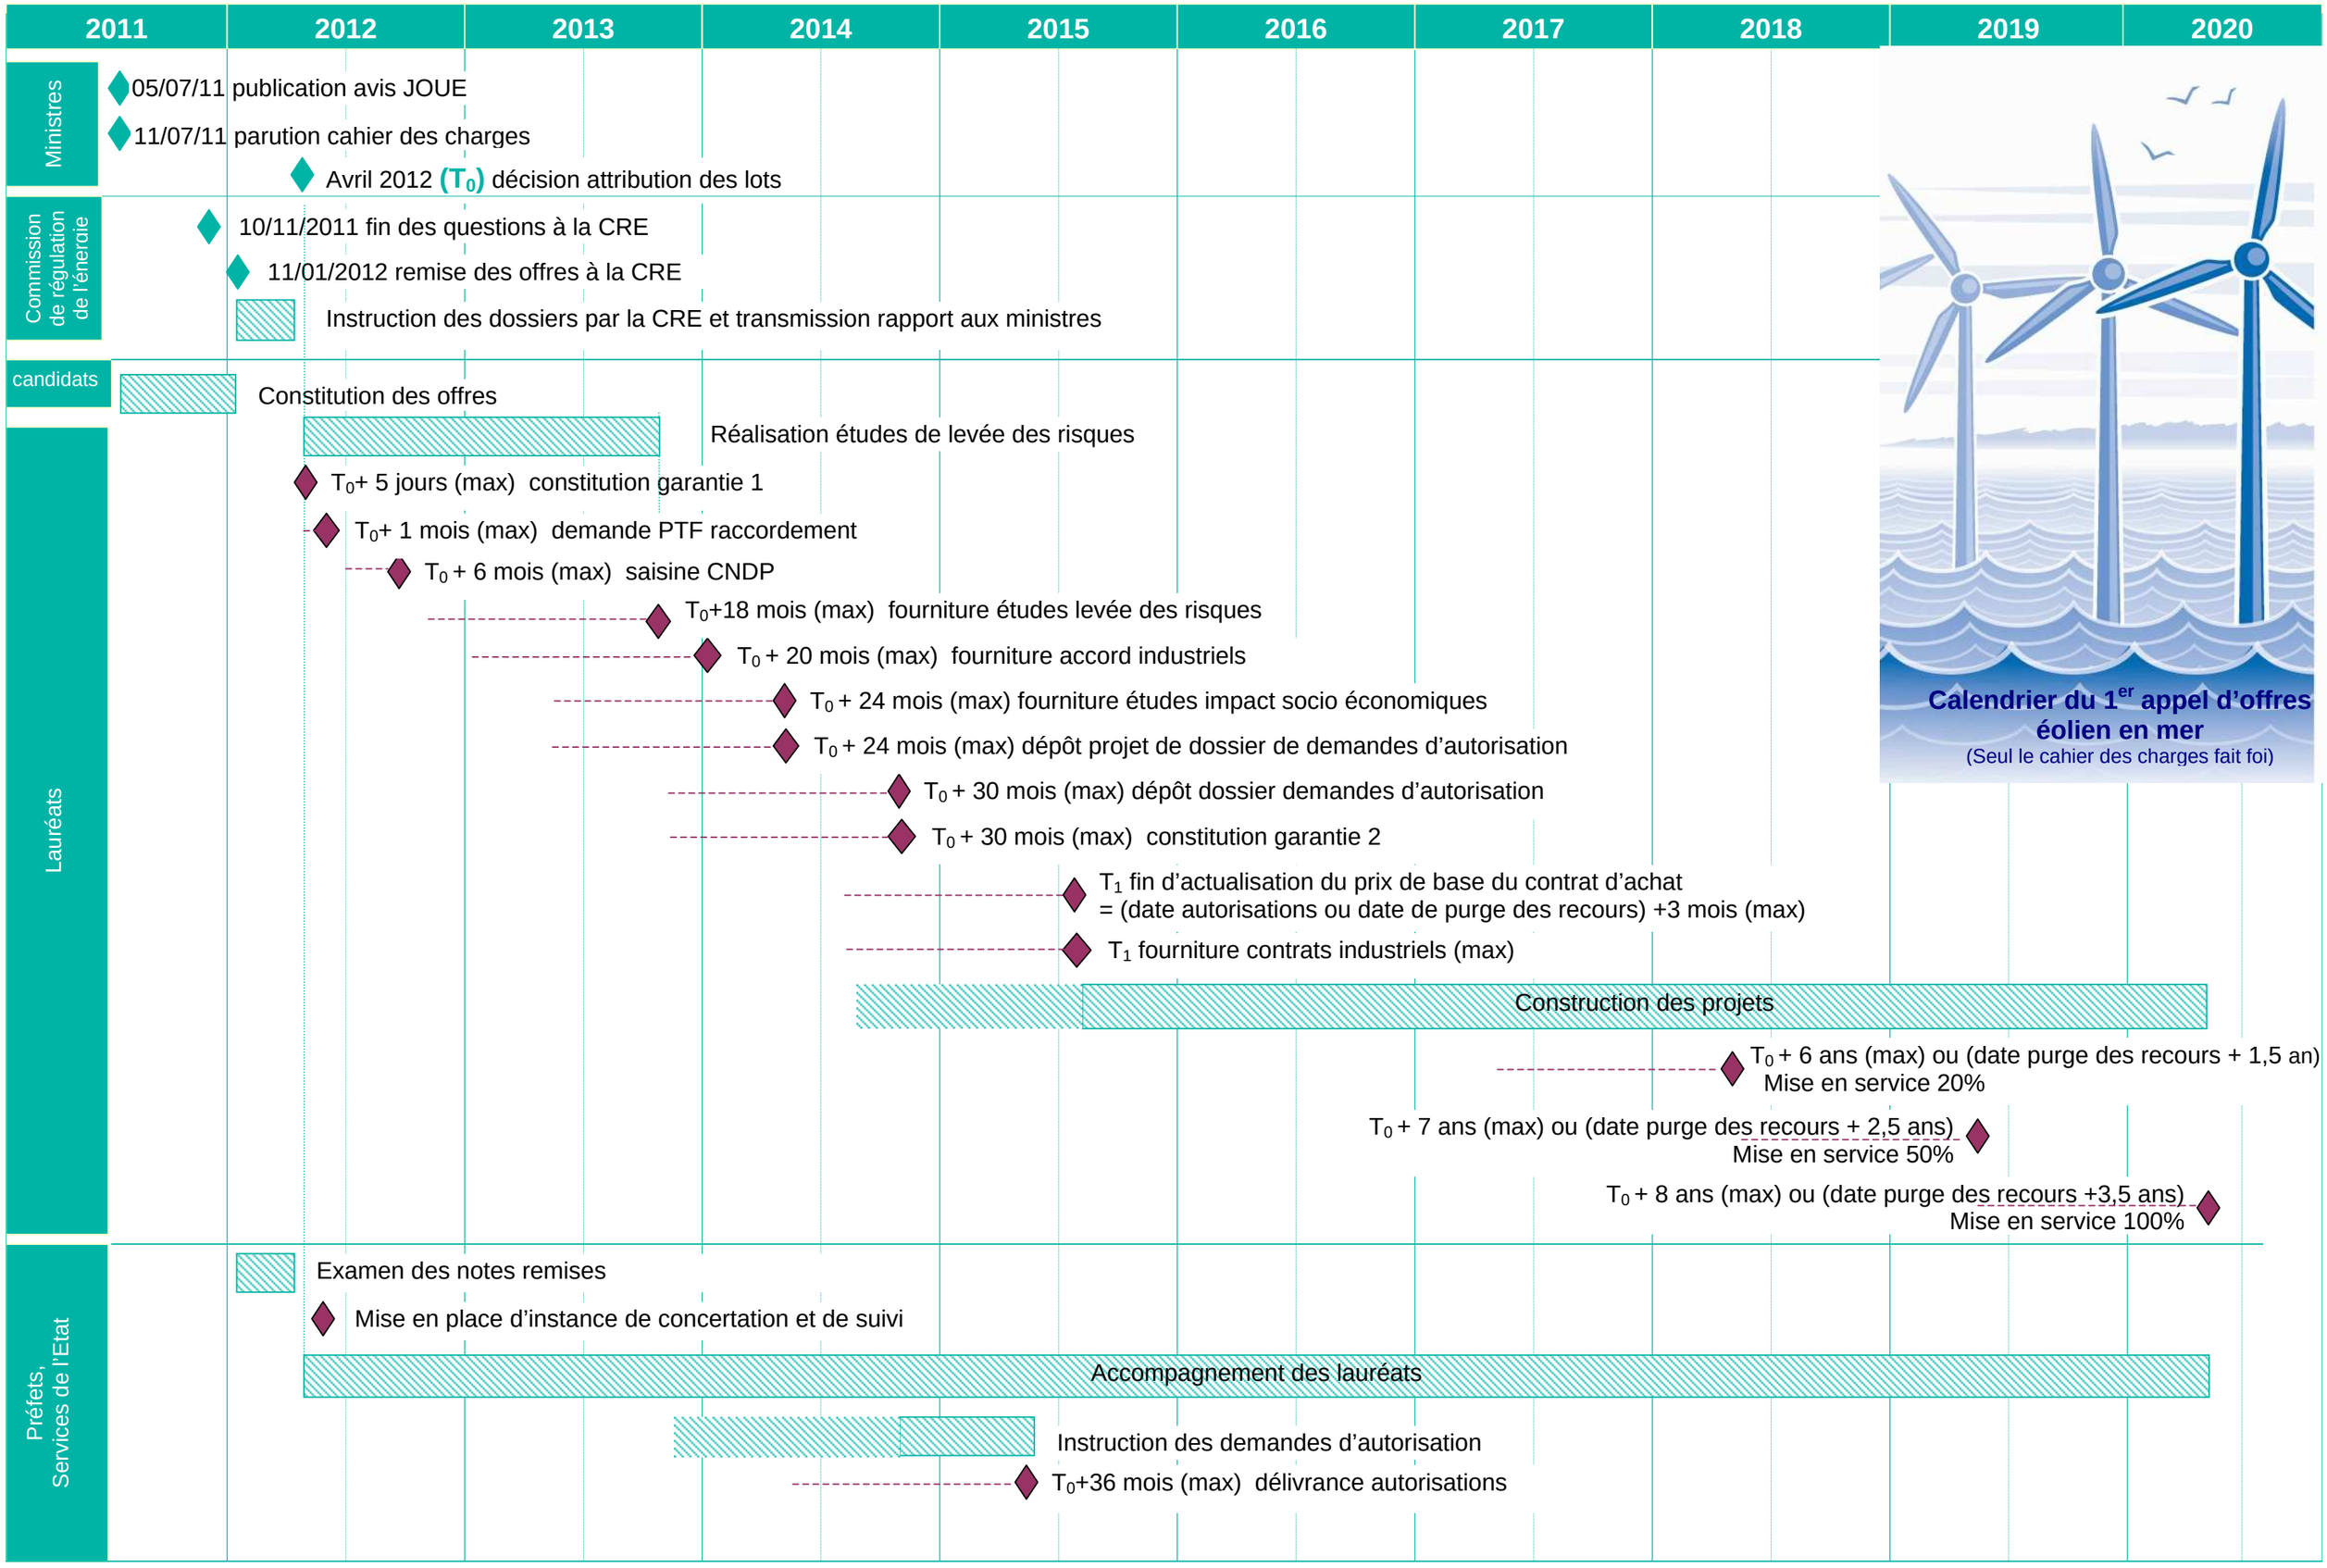
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Ministres
05/07/11 publication avis JOUE
11/07/11 parution cahier des charges
Avril 2012 (T0) décision attribution des lots
Commission de régulation de l'énergie
10/11/2011 fin des questions à la CRE
11/01/2012 remise des offres à la CRE
Instruction des dossiers par la CRE et transmission rapport aux ministres
candidats
Constitution des offres
Lauréats
Réalisation études de levée des risques
T0+ 5 jours (max) constitution garantie 1
T0+ 1 mois (max) demande PTF raccordement
T0 + 6 mois (max) saisine CNDP
T0+18 mois (max) fourniture études levée des risques
T0 + 20 mois (max) fourniture accord industriels
T0 + 24 mois (max) fourniture études impact socio économiques
T0 + 24 mois (max) dépôt projet de dossier de demandes d'autorisation
T0 + 30 mois (max) dépôt dossier demandes d'autorisation
T0 + 30 mois (max) constitution garantie 2
T1 fin d'actualisation du prix de base du contrat d'achat
= (date autorisations ou date de purge des recours) +3 mois (max)
T1 fourniture contrats industriels (max)
Construction des projets
T0 + 6 ans (max) ou (date purge des recours + 1,5 an)
Mise en service 20%
T0 + 7 ans (max) ou (date purge des recours + 2,5 ans)
Mise en service 50%
T0 + 8 ans (max) ou (date purge des recours +3,5 ans)
Mise en service 100%
Préfets, Services de l'Etat
Examen des notes remises
Mise en place d'instance de concertation et de suivi
Accompagnement des lauréats
Instruction des demandes d'autorisation
T0+36 mois (max) délivrance autorisations
Calendrier du 1er appel d'offres éolien en mer
(Seul le cahier des charges fait foi)
Jalons fermes
Dates « au plus tard »
